





# Hedda Andersson- gymnasiet & Svaneskolan

# Lite historia...

## Vad har hänt fram till idag

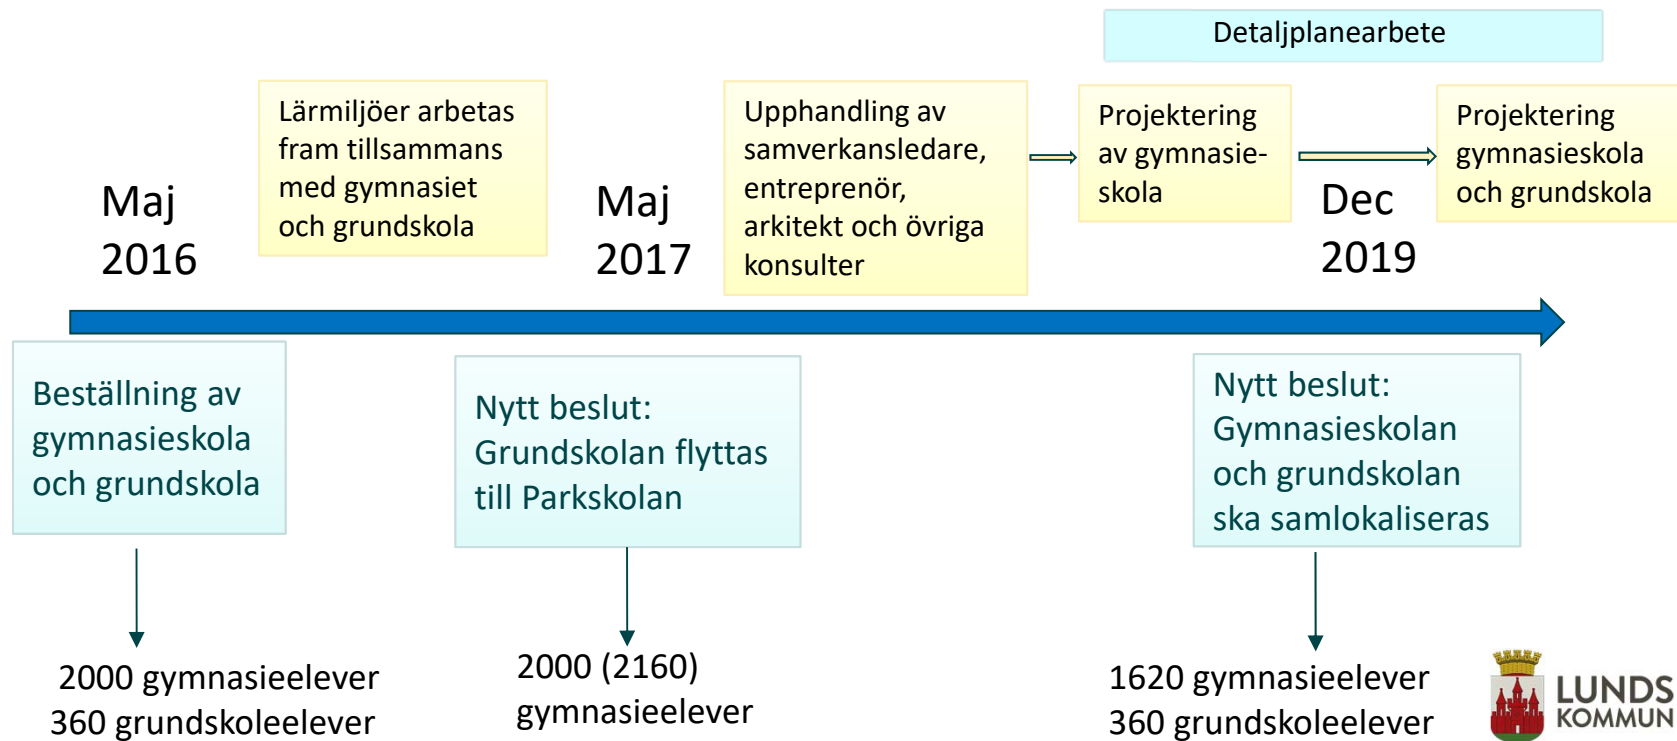

# Tidplan



Rivning v26-42

Grundl Hus B-E v32 20 – v15 21

Stomme tak v48 20 – v47 21

Grundl. hus A v19-32



Inflytt  
Hedda  
HT23

Inflytt  
Svane  
VT24



LUNDS  
KOMMUN

# Pågående / utförda arbeten

- Rivning och sanering i stort klar
  - Sanering av PCB, klorparaffiner, asbest mm
  - Borttransport förorenad betong (MKM), ca 12 000 ton (300 transporter)
  - Övrigt rivningsavfall ca 100 transporter
  - Återvinning av tegel (fyllnadsmassor) Uppskattningsvis 1500-1700 ton
- Schaktning
  - Ca 20 000 ton varav 15 000 ton återanvänds på arbetsplatsen → ca 125 transporter
  - Förstärkningsmaterial för uppackning av källare hus A, ca 16 000ton → 400 transporter

# Pågående arbete



- Grundläggningsarbete
  - Gjutning av hus B
  - Schakt hus E
- Tillverkning och detaljprojektering av prefabelement.
  - ca 4300 element ska tillverkas / monteras (väggar, bjälklag, trappor)
  - 570 lpm socklar

# Försegling Tidskapsel 9/9



Öppnas igen om 50  
år...

# Framdrift av projektet

- [HeddaSvane Produktionsfilm Musik-2.m4v](#)
